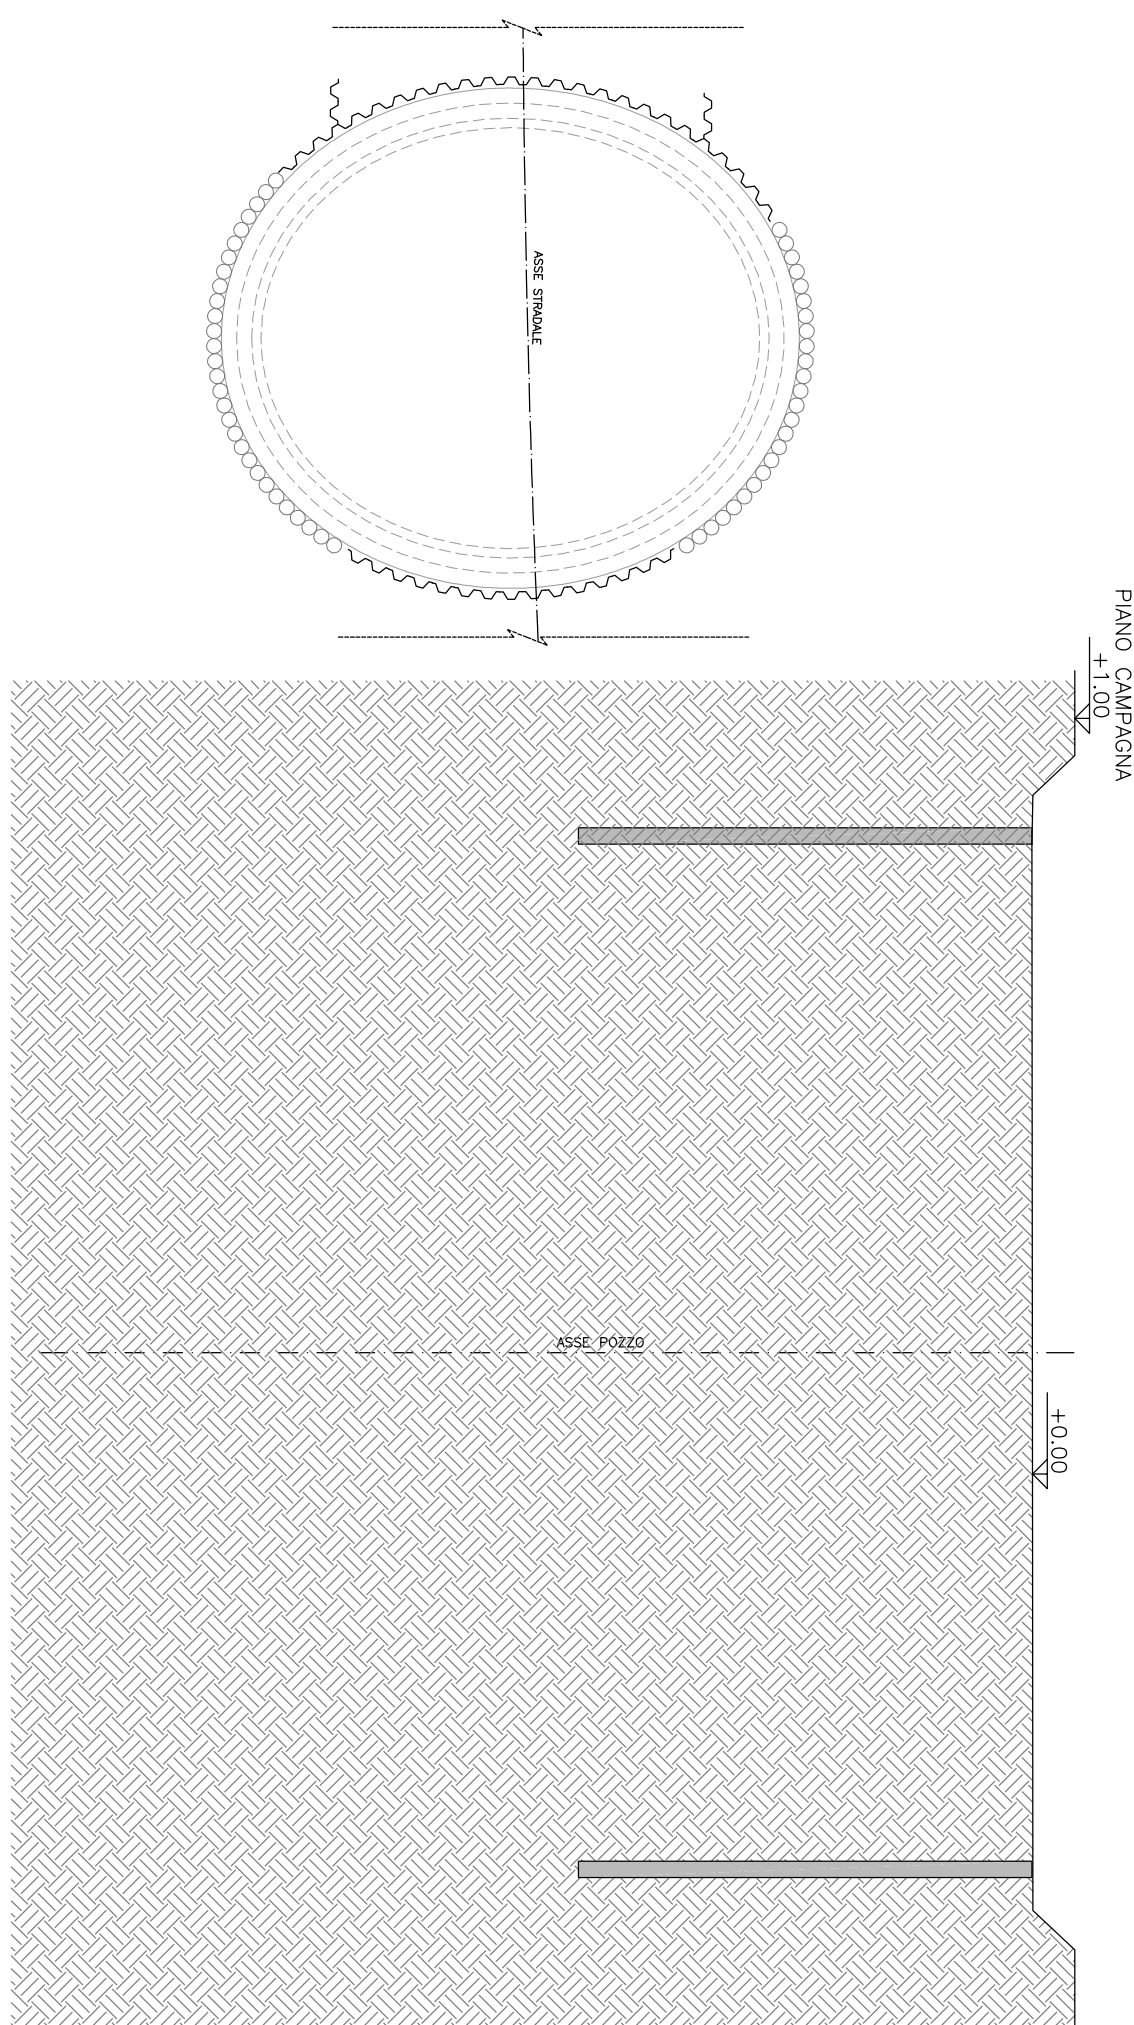
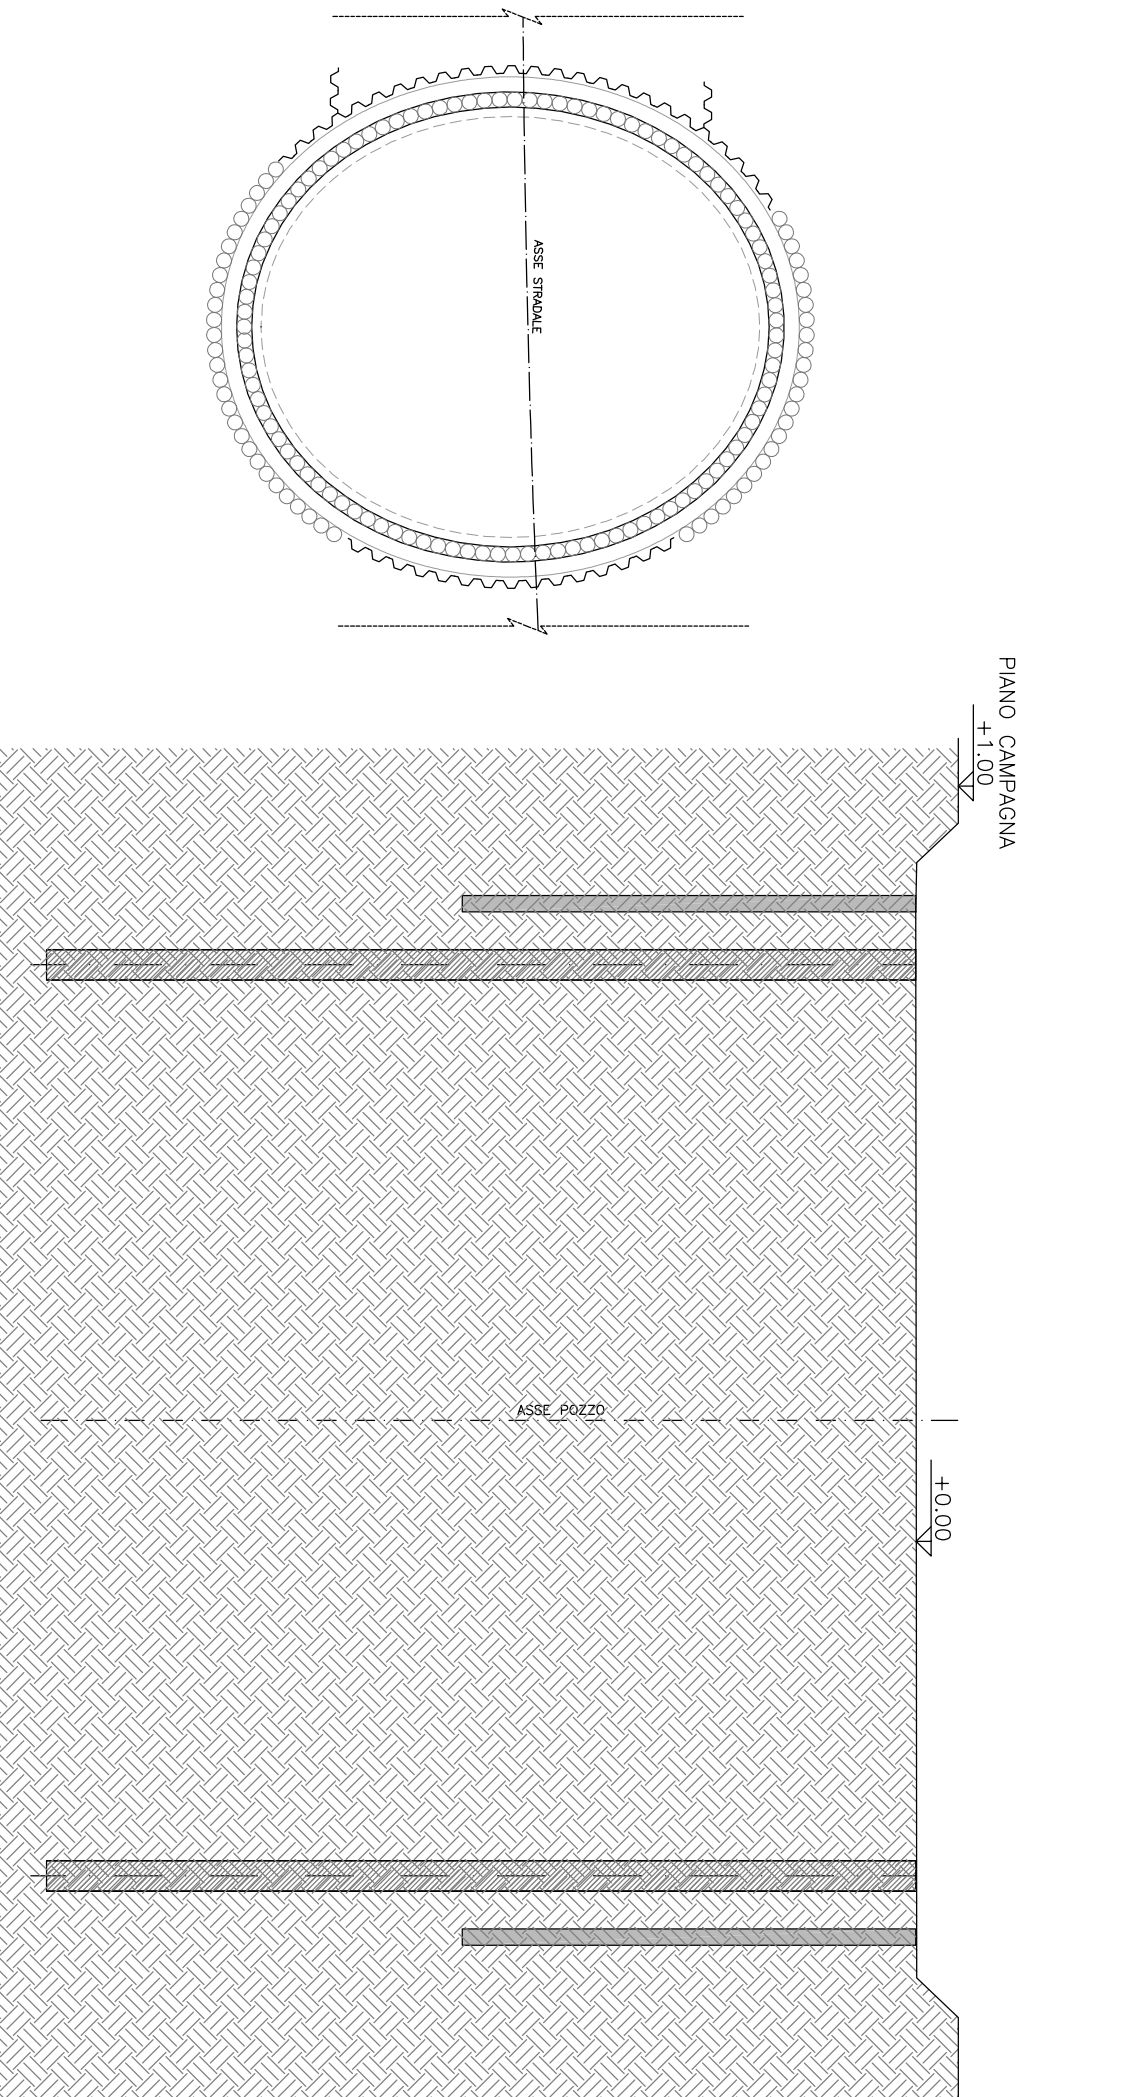
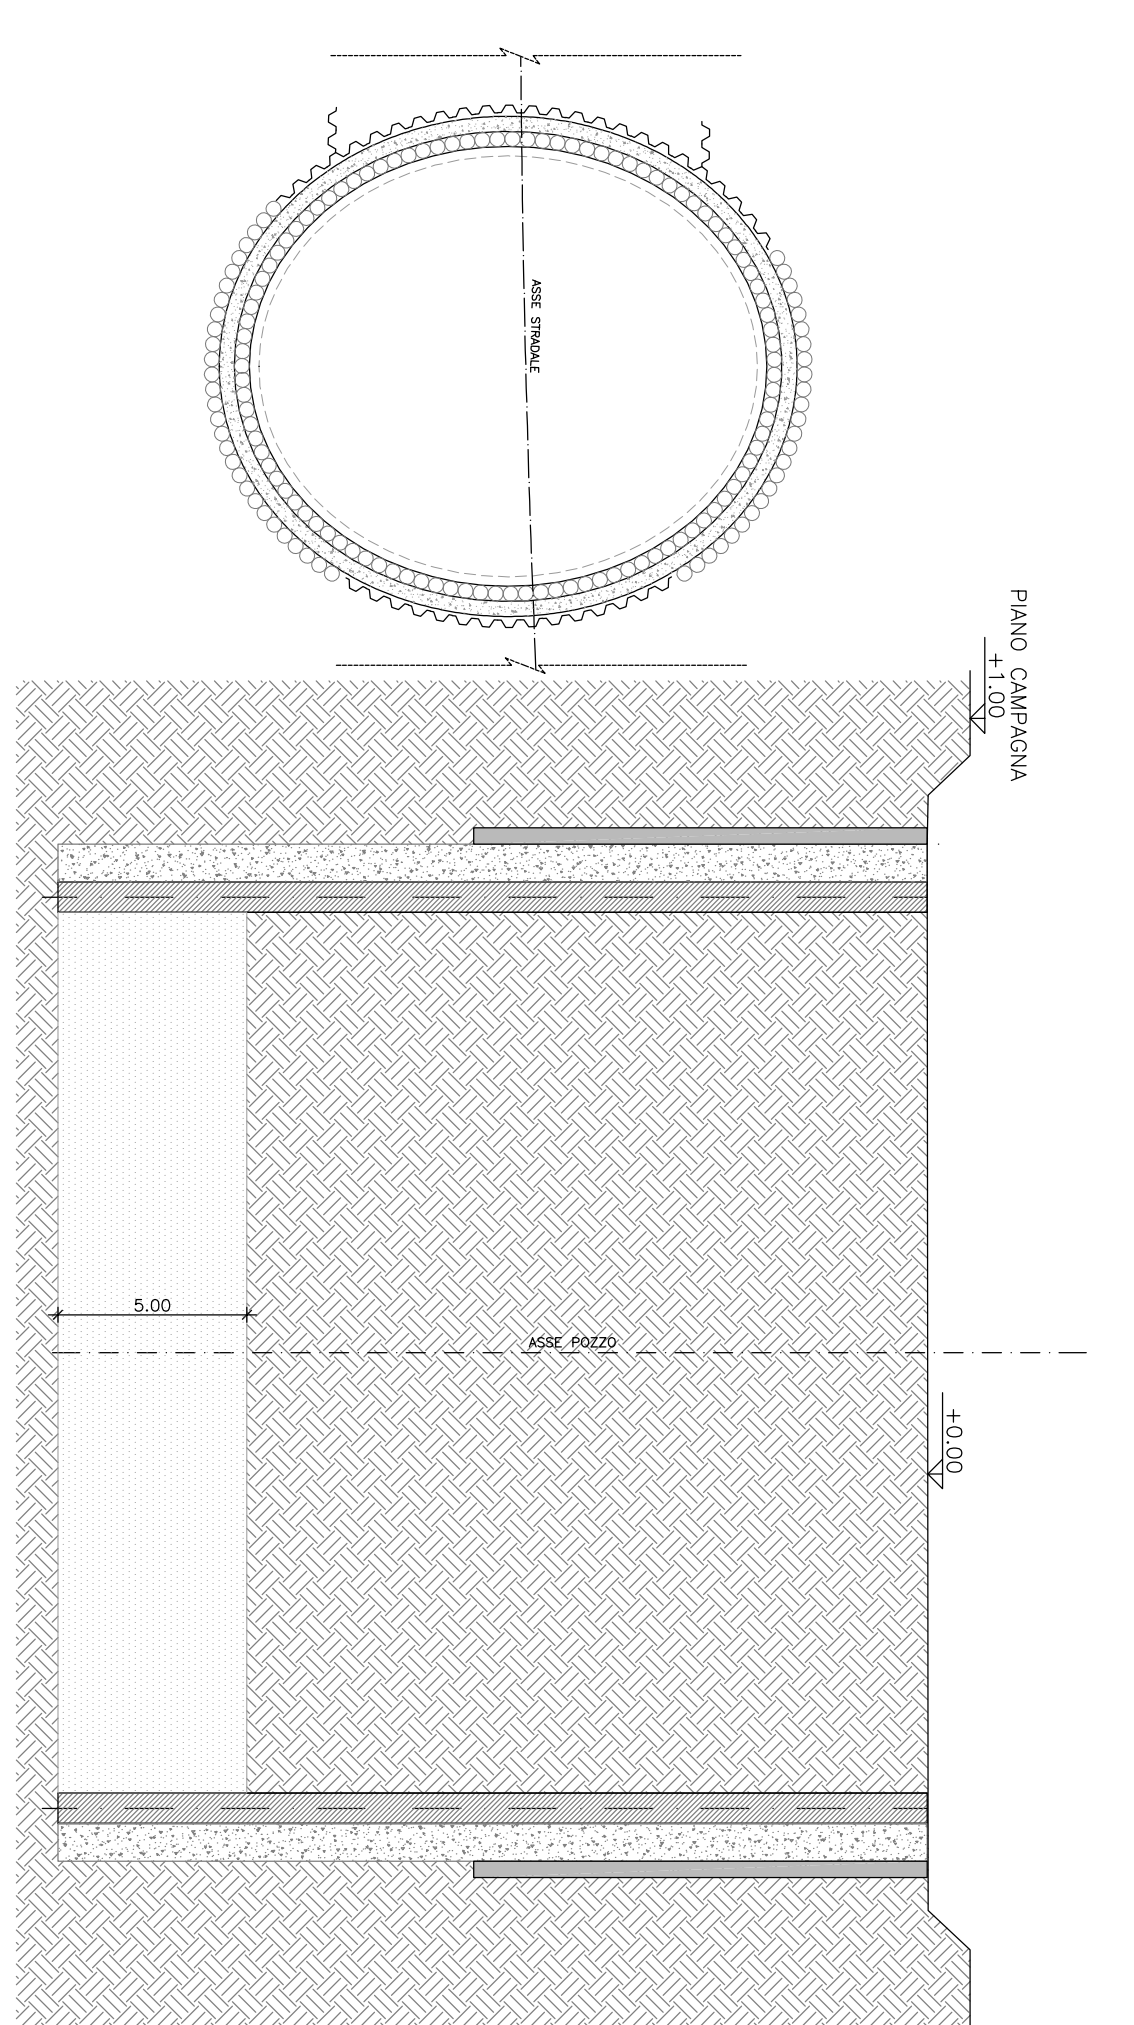
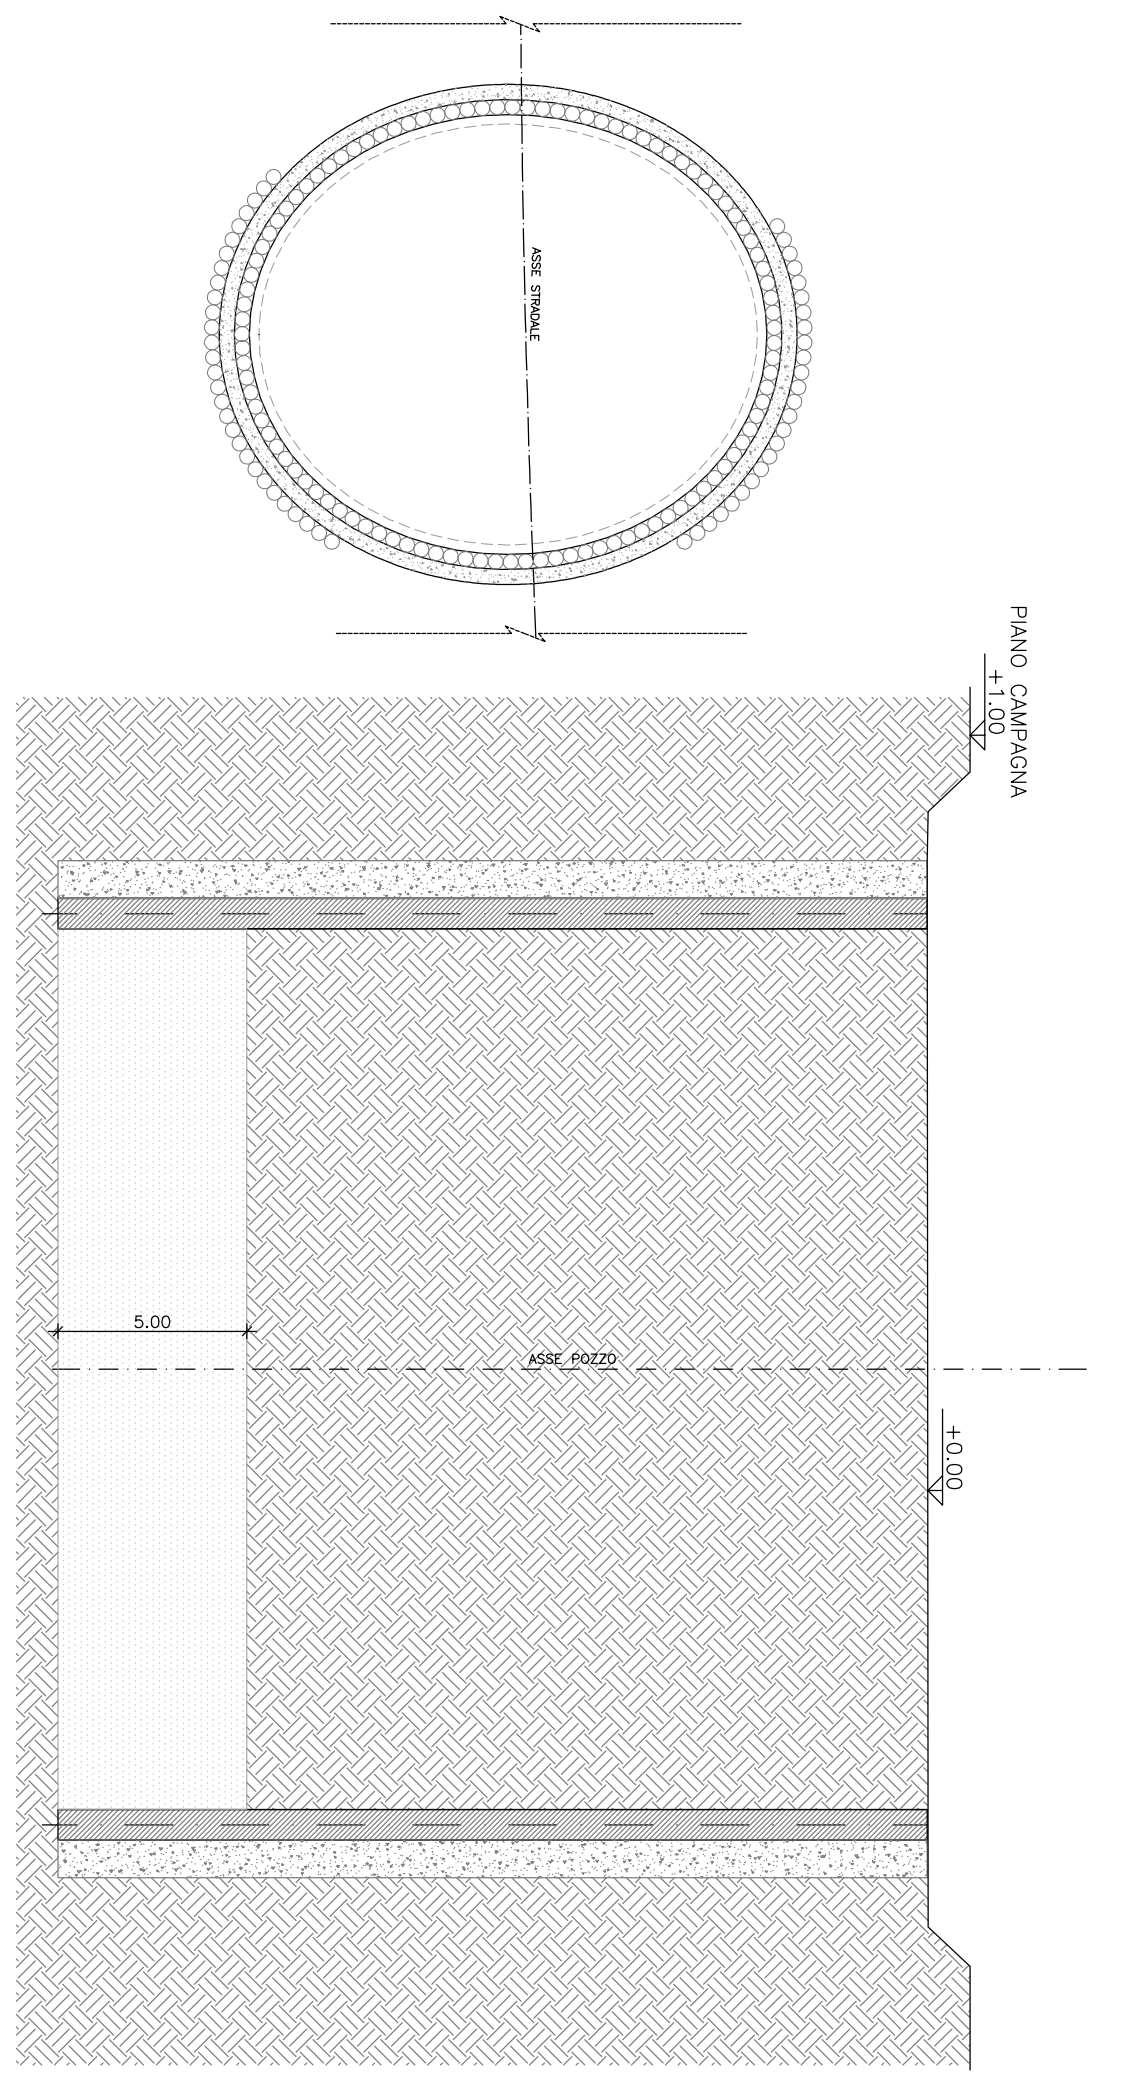
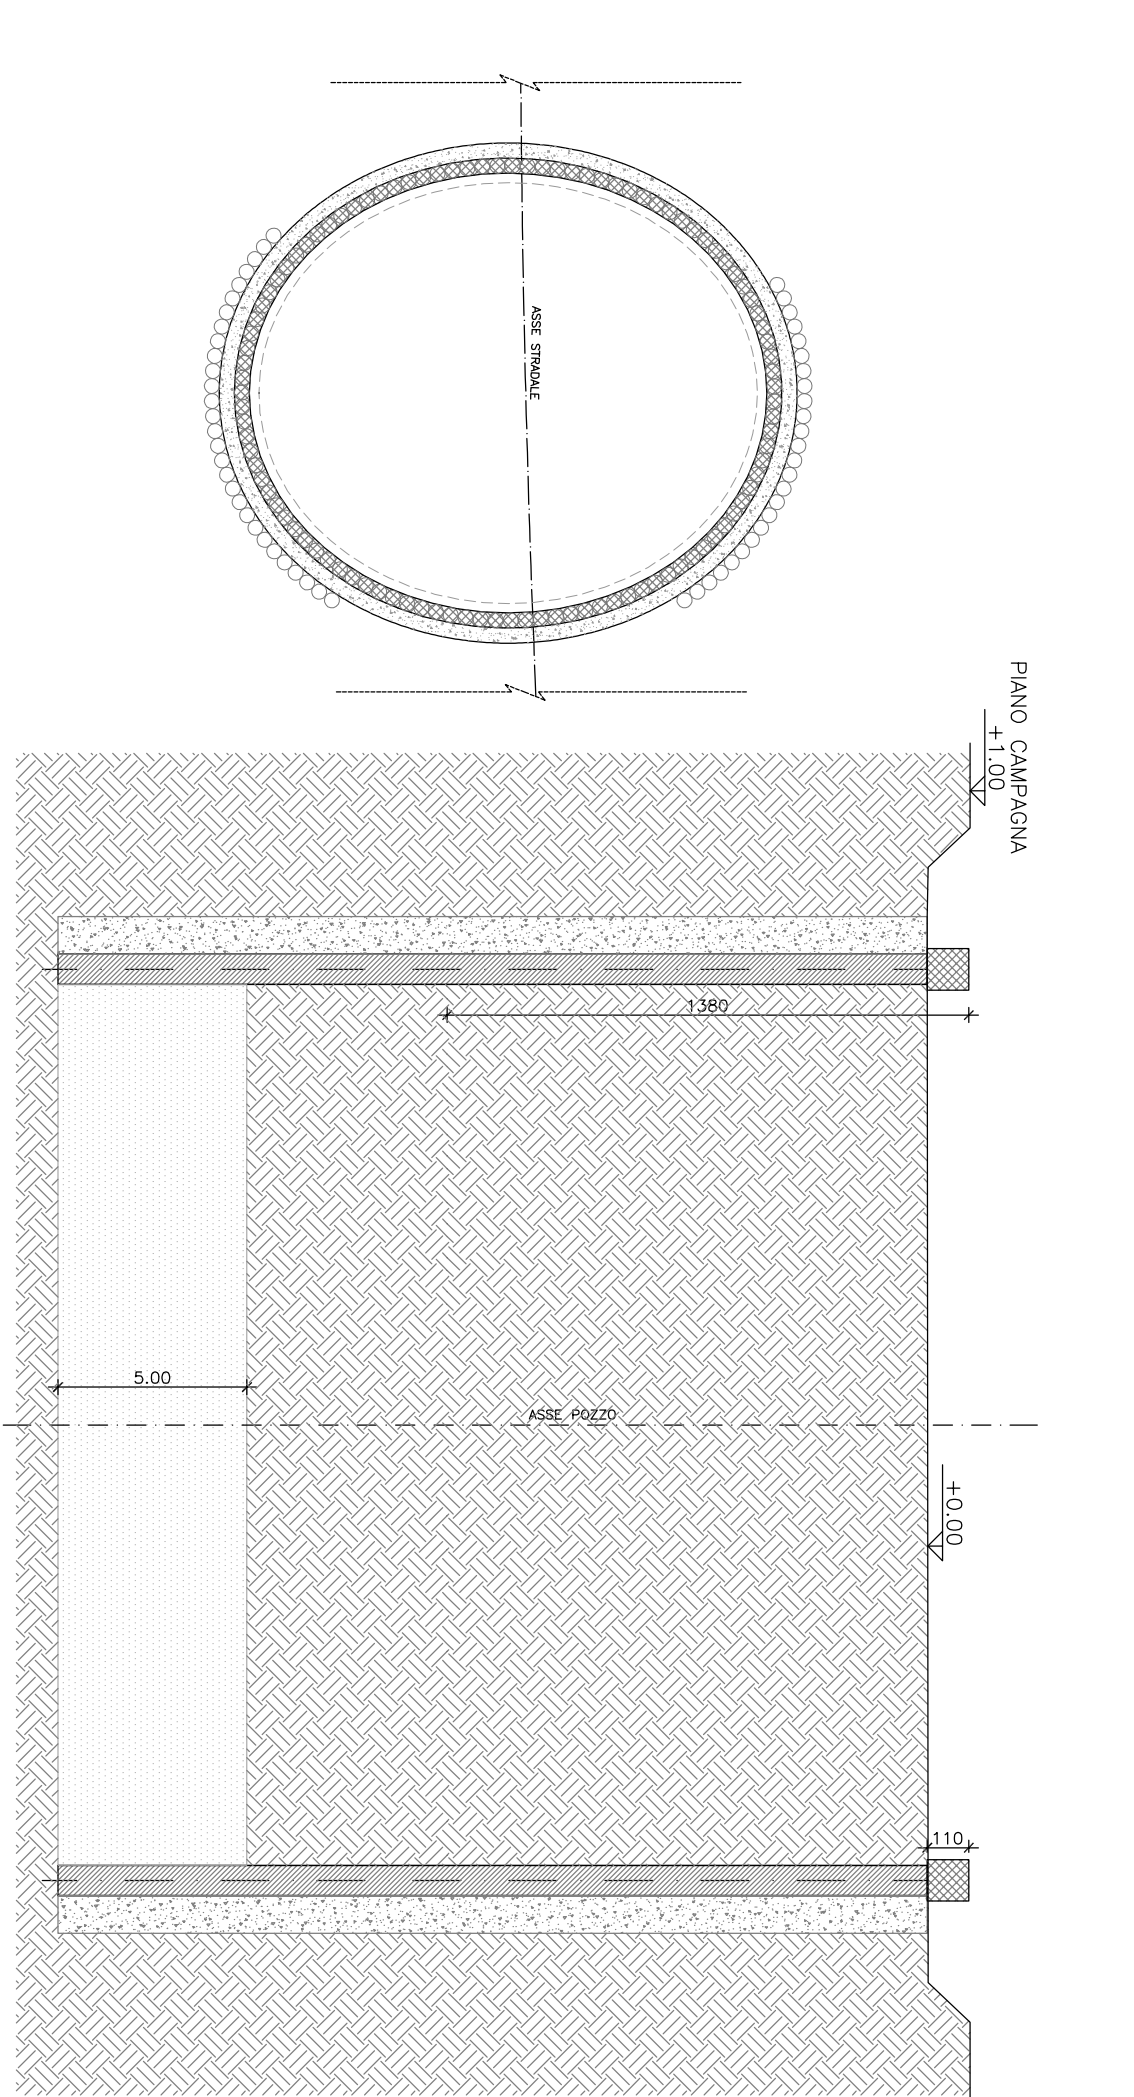
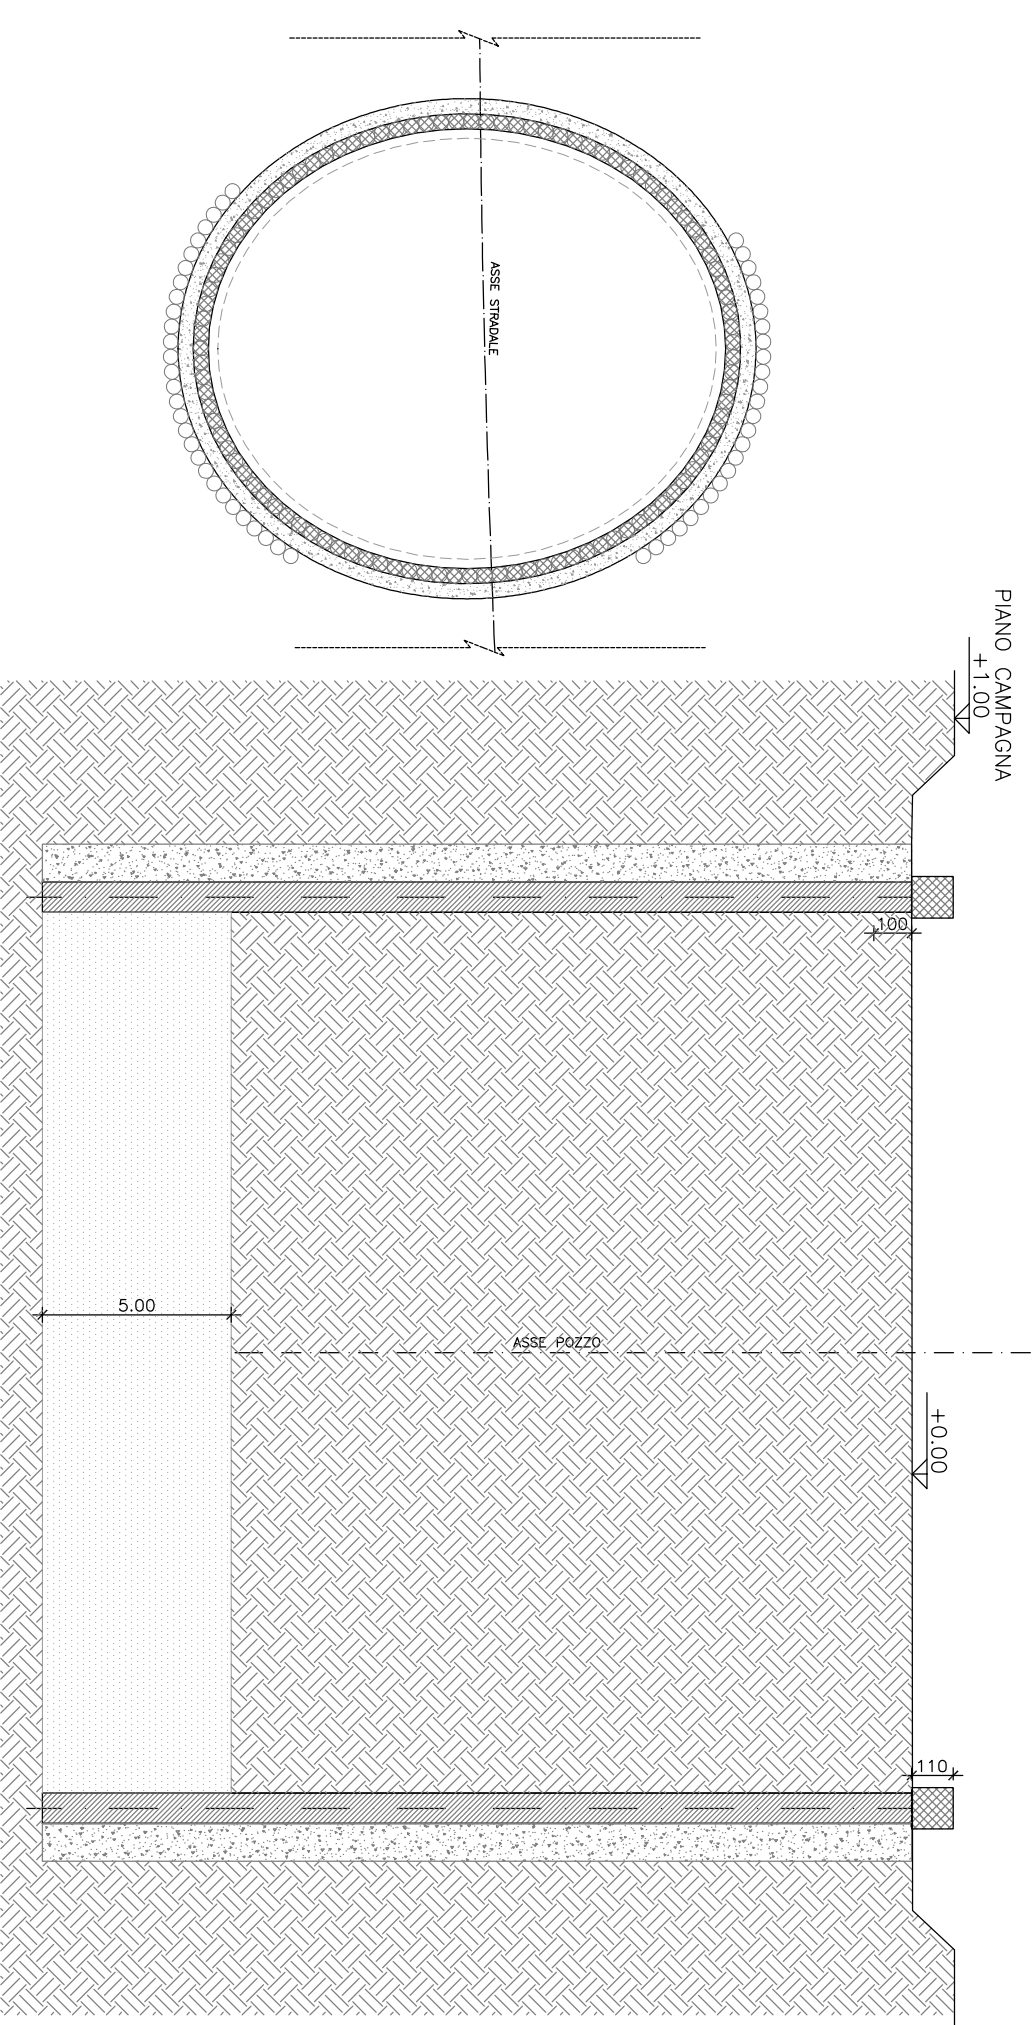
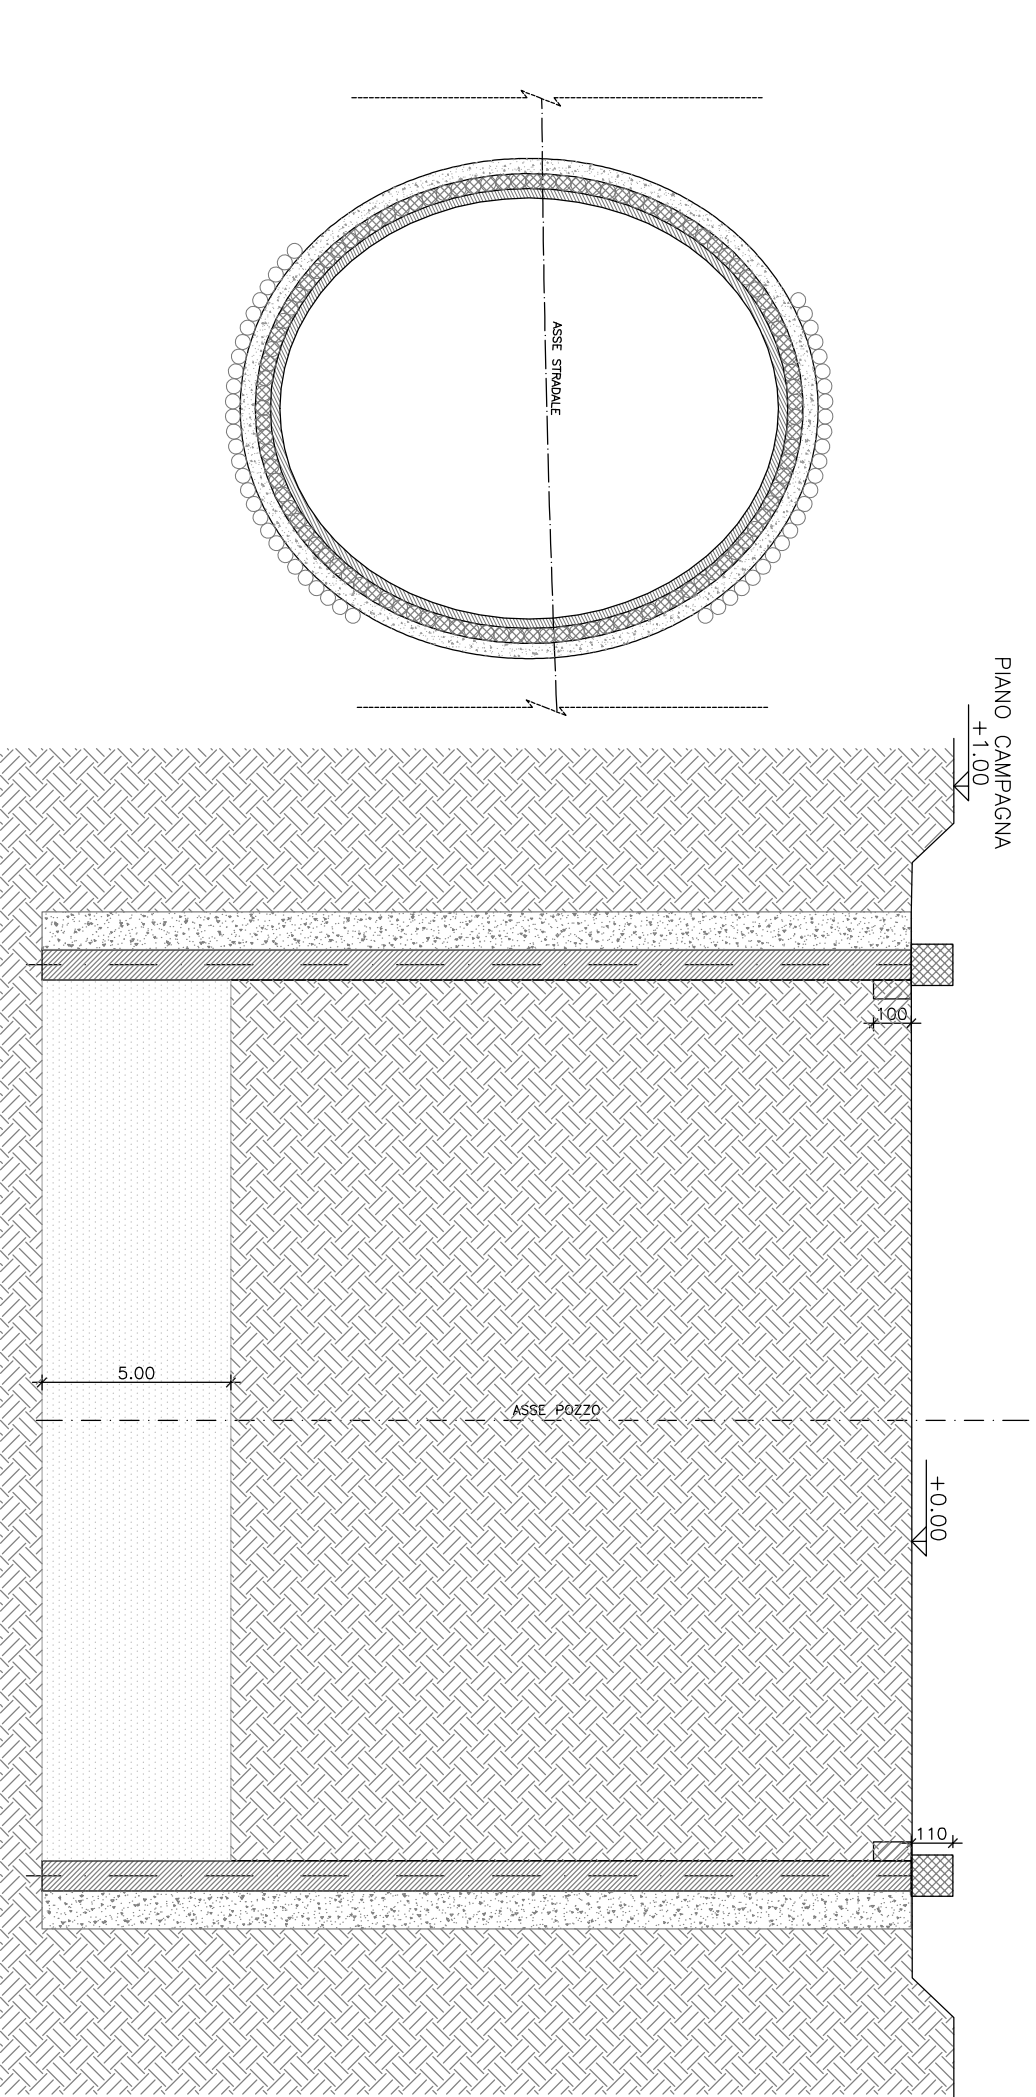
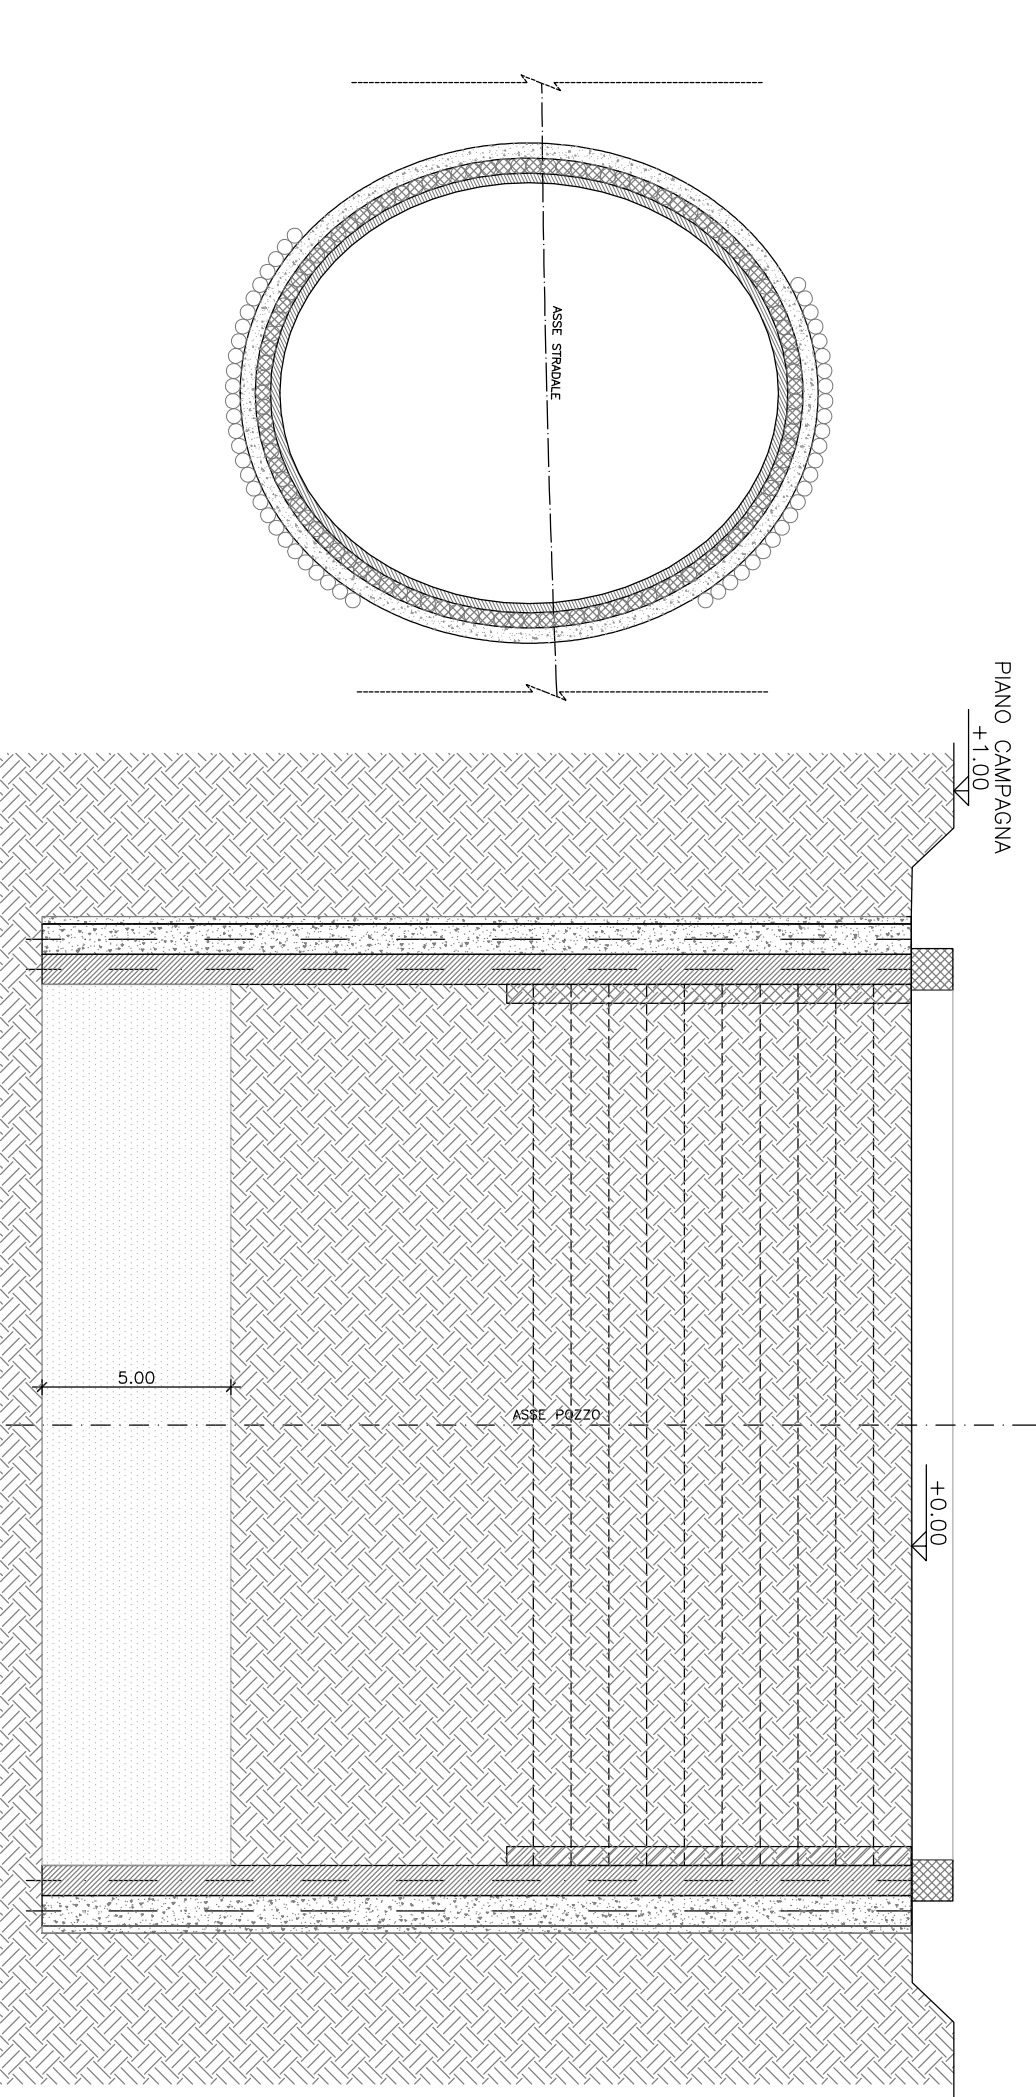


## FASI DI ESECUZIONE DEI POZZI

<p>FASE 1</p> <p>–Realizzazione del polincolo provvisorio e poli FDP a protezione degli edifici</p>	
<p>FASE 2</p> <p>–Esecuzione dei poli FDP in cls armato Ø800 di lunghezza L=25.00m</p>	
<p>FASE 5a</p> <p>–Esecuzione del tampone di fondo Ø1500mm moglia 1200x1200mm di altezza 5.00m alla base dei pali</p>	
<p>FASE 5b</p> <p>–Rimozione delle polincole</p>	
<p>FASE 6</p> <p>–Realizzazione del cordolo di testata</p>	
<p>FASE 7</p> <p>–Esecuzione dello scavo di 1.00m</p>	
<p>FASE 8</p> <p>–Posa in opera dell'armatura del rivestimento interno</p> <p>–Rediziazione del getto di cls per 1.00m</p>	
<p>FASE 9</p> <p>–Ripetizione della fase 7 e fase 8 fino a fondo scavo</p> <p>– Durante i ribossi verranno realizzati i consolidamenti da lato Mestre a lato Tessera relativi alla ditta di attacco ed alla galleria naturale per il sotto attraversamento di via Cobbi</p>	

[illegible][illegible]
